


令和5年度 産業労働局農林水産部森林土木優良工事等

【件名】	峰谷林道緊急災害復旧工事	【事務所名】	東京都森林事務所	
【工事場所】	東京都西多摩郡奥多摩町留浦地内	【受注者名】	大章建設 有限会社	
【工期】	令和4年8月17日～令和5年3月15日	【主たる技術者名】	主任技術者 オオシタ トシキ 大下 敏幸	

【工事概要】

土工：一式、吹付砕工：584㎡（砕内モルタル吹付工：353㎡）、モルタル吹付工：72㎡
鉄筋挿入工（ロックボルト）：300本

【表彰理由】（※発注者側評価）

本工事は、林道峰谷線において斜面崩落した箇所を、緊急で復旧を行う工事である。受注者は、現場条件の厳しい中、安全管理に努めるとともに、施工に関して技術的な提案が積極的になされ、工事を完了させた。また、施工した構造物の出来ばえも丁寧に仕上がっていた。上記の理由により、東京都工事成績評価において優良な評価結果であった。以上のことから、優良表彰の選定基準も満たすため（有）大章建設を推薦します。



施工前



施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

本工事現場は急傾斜地及び法面の起伏が大きく、法枠を地山に馴染ませるように設置した事や鉄筋挿入では硬質な岩盤を人力削孔により施工した事が苦労しました。

◇ 特に工夫した点

鉄筋挿入工を施工した際、硬質な岩盤で人力削孔の進捗が遅れたので施工班を増やし、災害防止の観点から上下作業にならない様に施工エリアの区分を行った事。

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

仮設モノレールで資材を小運搬しながらの作業でしたが、地山崩壊防止を目的とした法枠工及び鉄筋挿入工が完成した時はこれで災害が防げると物凄い達成感を感じました。


◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

自然災害が多発している今の現代に建設業は無くしてはならない仕事の一つです。我々の仕事で多くの人々が安全かつ便利に暮らしていけるのだと思っておりますので興味を持っていただきたいです。

林道上に設置した吹付機械



狭隘箇所のためロープ足場による施工を実施

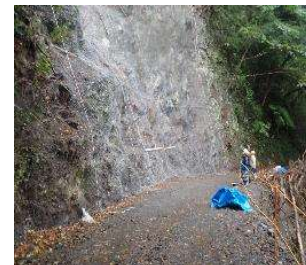

整理された資材置き場

